
PROGRES PEMBANGUNAN PSU 2026

Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat

DATA UMUM PEKERJAAN	
Nama Paket	Pembangunan PSU Perumahan Tapak SMK Residence 2 Kabupaten Deli Serdang T.A. 2026 (50 Unit)
Lokasi Pekerjaan	Perumahan Tapak SMK Residence 2 Kabupaten Deli Serdang
Jenis Bantuan	Jalan Lingkungan Beton Sc 3,5 Mpa setara f'c 25 MPa
Unit Bantuan	50 Unit
Panjang Jalan	150 meter
Ruas Jalan	3 Ruas
Waktu Pelaksanaan	90 Hari

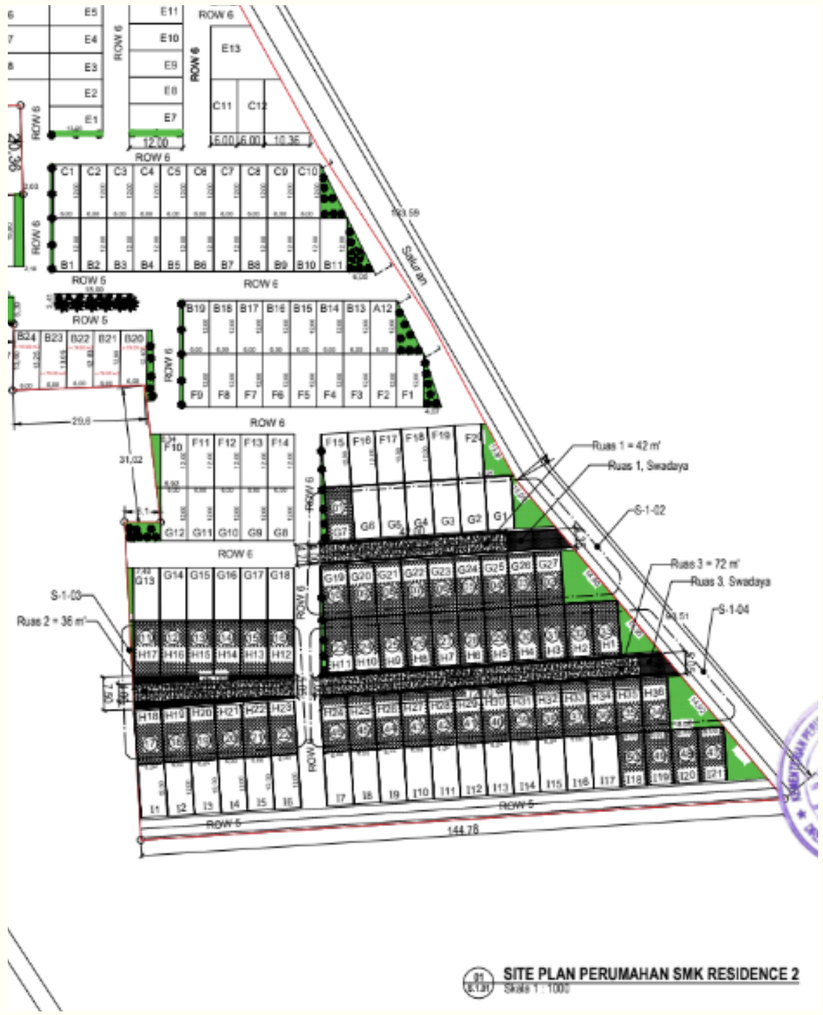


PROGRES PEMBANGUNAN PSU 2026

Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat

INFORMASI KONTRAK	
Penyedia Jasa	PT. SUKA MAJU KREASI
SPPBJ	10 Agustus 2026
Jangka Kontrak	20 Agustus 2026 - 17 November 2026
Nilai Kontrak	Rp. 258.658.278,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT (%)	AGUSTUS		SEPTEMBER					OKTOBER				NOVEMBER			KETERANGAN
					20/8	22/8	29/8	5/9	12/9	19/9	26/9	3/10	10/10	17/10	24/10	31/10	7/11	14/11	
					21/8	28/8	4/9	11/9	18/9	25/9	2/10	9/10	16/10	23/10	30/10	6/11	13/11	17/11	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	4	5	6	7														
A	PEKERJAAN PERSIAPAN																		
A.1	Pekerjaan Papan Proyek	1.00	bh	0.46		0.09	0.37												
A.2	Pekerjaan Penerapan K3	1.00	set	0.46			0.14	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
B	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN SEGMEN BLOK - G																		
B.1	Pekerjaan beton kurus f'c 10 Mpa dengan Ready Mix tebal 10 cm	16.8	m3	9.62				0.96	2.89	2.89	2.89								
B.2	Pekerjaan beton Sc 3,5 Mpa setara f'c 25 Mpa dengan Ready Mix tebal 15 cm	25.2	m3	18.12								4.53	4.53	4.53	4.53				
C	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN SEGMEN BLOK - H SISI KIRI																		
C.1	Pekerjaan beton kurus f'c 10 Mpa dengan Ready Mix tebal 10 cm	14.4	m3	8.25						2.47	2.89	2.89							
C.2	Pekerjaan beton Sc 3,5 Mpa setara f'c 25 Mpa dengan Ready Mix tebal 15 cm	21.6	m3	15.53									3.88	3.88	3.88	3.88			
D	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN SEGMEN BLOK - H SISI KANAN																		
D.1	Pekerjaan beton kurus f'c 10 Mpa dengan Ready Mix tebal 10 cm	28.8	m3	16.50								1.65	4.95	4.95	4.95				
D.2	Pekerjaan beton Sc 3,5 Mpa setara f'c 25 Mpa dengan Ready Mix tebal 15 cm	43.2	m3	31.06											6.21	12.43	12.43		
E	Jumlah Bobot			100.00															
	Rencana Mingguan				-	0.09	0.51	0.99	2.92	5.39	5.80	9.10	13.39	13.39	19.60	16.34	12.45	0.03	
	Rencana Kumulatif Mingguan				-	0.09	0.60	1.59	4.51	9.90	15.70	24.79	38.19	51.58	71.18	87.52	99.97	100.00	
	Realisasi Mingguan				-	-	0.46	0.23	4.03	4.03	5.75	8.61	19.23	17.99	21.44				
	Komulatif Realisasi Komulatif Mingguan				-	-	0.46	0.69	4.72	8.75	14.50	23.10	42.34	60.33	81.77				
	Deviasi				-	- 0.09	- 0.14	- 0.90	0.21	- 1.15	- 1.20	- 1.69	4.15	8.75	10.59				

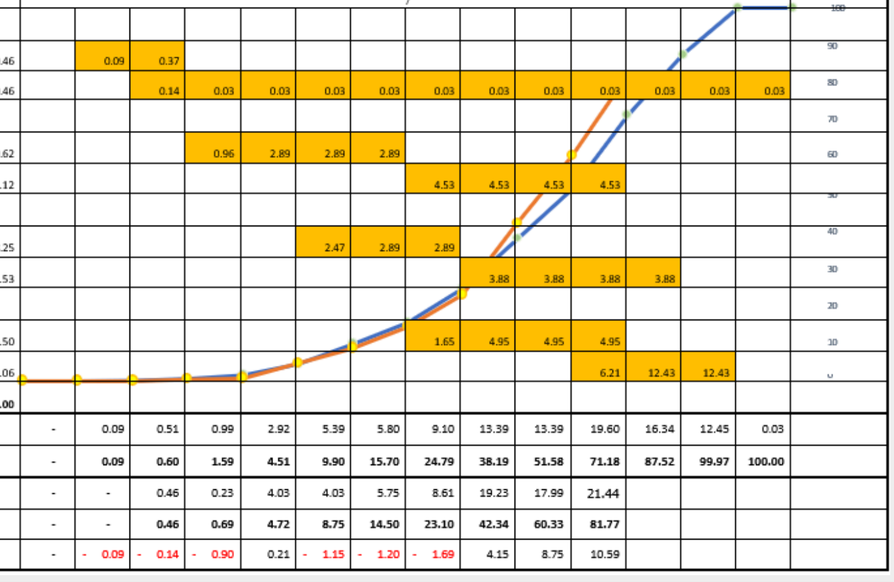

Data Progres Pembangunan PSU Minggu IX (17 Oktober s.d. 23 Oktober 2026)	
Rencana Kumulatif Mingguan	71,18%
Realisasi Kumulatif Mingguan	**81,77%**
Deviasi	10,59%

KONDISI EXISTING



PEKERJAAN SAAT INI-PEKERJAAN PERKERASAN JALAN SEGMEN BLOK - H SISI KANAN

